Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken
1	Werkterrein inrichting	5 dagen	maa 25 jul '11	vri 29 jul '11	
2	Fase 1	70 dagen	maa 1 aug '11	vri 4 nov '11	1
3	Opbreken straatwerk	65 dagen	maa 1 aug '11	vri 28 okt '11	
4	Aanbrengen riool (dw)	65 dagen	din 2 aug '11	maa 31 okt '11	3GB+1 dag
5	Aanbrengen straatwerk	59 dagen	din 16 aug '11	vri 4 nov '11	4GB+10 dagen
6	Fase 2	50 dagen	vri 14 okt '11	don 22 dec '11	
7	**Fase 2 A**	**19 dagen**	**vri 14 okt '11**	**woe 9 nov '11**	
8	Opbreken straatwerk	15 dagen	vri 14 okt '11	don 3 nov '11	74
9	Aanbrengen riool	15 dagen	maa 17 okt '11	vri 4 nov '11	8GB+1 dag
10	Aanbrengen straatwerk	13 dagen	maa 24 okt '11	woe 9 nov '11	9GB+5 dagen
11	**Fase 2 B**	**29 dagen**	**maa 14 nov '1**	**don 22 dec '11**	
12	Opnemen Asfalt + fund.	1,5 dagen	maa 14 nov '1	din 15 nov '11	
13	Aanbrengen riool	12 dagen	din 15 nov '11	don 1 dec '11	12
14	Asfaltwerkzaamheden	2 dagen	maa 5 dec '11	din 6 dec '11	15
15	Opnemen Asfalt + fund.	1,5 dagen	don 1 dec '11	vri 2 dec '11	13
16	Aanbrengen riool	12 dagen	don 1 dec '11	vri 16 dec '11	15BE-2 dagen
17	Asfaltwerkzaamheden	4 dagen	maa 19 dec '1	don 22 dec '11	16
18	Fase 3	80 dagen	maa 7 nov '11	maa 12 mrt '12	
19	**Fase 3 A**	**15 dagen**	**don 1 dec '11**	**don 22 dec '11**	
20	Opbreken straatwerk	12 dagen	don 1 dec '11	maa 19 dec '11	13
21	Aanbrengen riool	12 dagen	vri 2 dec '11	din 20 dec '11	20GB+1 dag
22	Aanbrengen straatwerk	9 dagen	vri 9 dec '11	don 22 dec '11	21GB+5 dagen
23	**Fase 3 B**	**8 dagen**	**maa 14 nov '1**	**woe 23 nov '11**	
24	Opbreken straatwerk	7 dagen	maa 14 nov '1	din 22 nov '11	32
25	Aanbrengen riool	7 dagen	din 15 nov '11	woe 23 nov '11	24GB+1 dag
26	Aanbrengen straatwerk	4 dagen	vri 18 nov '11	woe 23 nov '11	25GB+3 dagen
27	**Fase 3 C**	**12 dagen**	**vri 24 feb '12**	**maa 12 mrt '12**	
28	Opbreken straatwerk	8 dagen	vri 24 feb '12	din 6 mrt '12	42
29	Aanbrengen riool	8 dagen	maa 27 feb '12	woe 7 mrt '12	28GB+1 dag
30	Aanbrengen straatwerk	6 dagen	maa 5 mrt '12	maa 12 mrt '12	29GB+5 dagen
31	**Fase 3 D**	**7 dagen**	**maa 7 nov '11**	**din 15 nov '11**	
32	Opbreken straatwerk	5 dagen	maa 7 nov '11	vri 11 nov '11	
33	Aanbrengen riool	5 dagen	din 8 nov '11	maa 14 nov '11	32GB+1 dag
34	Aanbrengen straatwerk	3 dagen	vri 11 nov '11	din 15 nov '11	33GB+3 dagen
35	Fase 4	76 dagen	don 3 nov '11	vri 2 mrt '12	
36	**Fase 4 A**	**28 dagen**	**don 3 nov '11**	**maa 12 dec '11**	
37	Opbreken straatwerk	15 dagen	don 3 nov '11	woe 23 nov '11	4
38	Aanbrengen riool (dw)	15 dagen	vri 4 nov '11	don 24 nov '11	37GB+1 dag
39	Aanbrengen straatwerk	17 dagen	vri 18 nov '11	maa 12 dec '11	38GB+10 dagen
40	**Opnemen Asfalt + fund.**	**2 dagen**	**maa 9 jan '12**	**din 10 jan '12**	
41	**Fase 4 B**	**32 dagen**	**woe 11 jan '12**	**don 23 feb '12**	
42	Aanbrengen riool	32 dagen	woe 11 jan '12	don 23 feb '12	40
43	**Fase 4 C**	**25 dagen**	**woe 11 jan '12**	**din 14 feb '12**	
44	Aanbrengen riool	25 dagen	woe 11 jan '12	din 14 feb '12	42GB
45	**Asfaltwerkzaamheden**	**6 dagen**	**vri 24 feb '12**	**vri 2 mrt '12**	42
46	Fase 5	80 dagen	maa 28 nov '1	maa 2 apr '12	
47	**Fase 5 A**	**18 dagen**	**maa 28 nov '1**	**woe 21 dec '11**	
48	Opbreken straatwerk	16 dagen	maa 28 nov '1	maa 19 dec '11	38
49	Aanbrengen riool	16 dagen	din 29 nov '11	din 20 dec '11	48GB+1 dag
50	Aanbrengen straatwerk	16 dagen	woe 30 nov '1	woe 21 dec '11	49GB+1 dag
51	**Fase 5 B**	**7 dagen**	**woe 15 feb '1**	**don 23 feb '12**	
52	Opbreken straatwerk	6 dagen	woe 15 feb '12	woe 22 feb '12	44
53	Aanbrengen riool	6 dagen	don 16 feb '12	don 23 feb '12	52GB+1 dag
54	Aanbrengen straatwerk	3 dagen	din 21 feb '12	don 23 feb '12	53GB+3 dagen
55	**Fase 5 C**	**28 dagen**	**don 23 feb '12**	**maa 2 apr '12**	
56	Opbreken straatwerk	22 dagen	don 23 feb '12	vri 23 mrt '12	52
57	Aanbrengen riool	22 dagen	vri 24 feb '12	maa 26 mrt '12	56GB+1 dag
58	Aanbrengen straatwerk	22 dagen	vri 2 mrt '12	maa 2 apr '12	57GB+5 dagen
59	**Fase 5 D**	**8 dagen**	**woe 15 feb '1**	**vri 24 feb '12**	
60	Opbreken straatwerk	6 dagen	woe 15 feb '12	woe 22 feb '12	44
61	Aanbrengen riool	6 dagen	don 16 feb '12	don 23 feb '12	60GB+1 dag
62	Aanbrengen straatwerk	4 dagen	din 21 feb '12	vri 24 feb '12	61GB+3 dagen
63	**Fase 5 E**	**14 dagen**	**woe 14 mrt '1**	**maa 2 apr '12**	
64	Opbreken straatwerk	9 dagen	woe 14 mrt '1	maa 26 mrt '12	69BE+4 dagen
65	Aanbrengen riool	9 dagen	don 15 mrt '12	din 27 mrt '12	64GB+1 dag
66	Aanbrengen straatwerk	9 dagen	woe 21 mrt '1	maa 2 apr '12	65GB+4 dagen
67	**Fase 5 F**	**14 dagen**	**don 23 feb '12**	**din 13 mrt '12**	
68	Opbreken straatwerk	9 dagen	don 23 feb '12	din 6 mrt '12	60
69	Aanbrengen riool	9 dagen	vri 24 feb '12	woe 7 mrt '12	68GB+1 dag
70	Aanbrengen straatwerk	9 dagen	don 1 mrt '12	din 13 mrt '12	69GB+4 dagen
71	**Fase 6**	**16 dagen**	**don 22 sep '11**	**don 13 okt '11**	
72	Opbreken straatwerk	12 dagen	don 22 sep '11	vri 7 okt '11	
73	Aanbrengen riool	12 dagen	vri 23 sep '11	maa 10 okt '11	72GB+1 dag
74	Aanbrengen straatwerk	10 dagen	vri 30 sep '11	don 13 okt '11	73GB+5 dagen

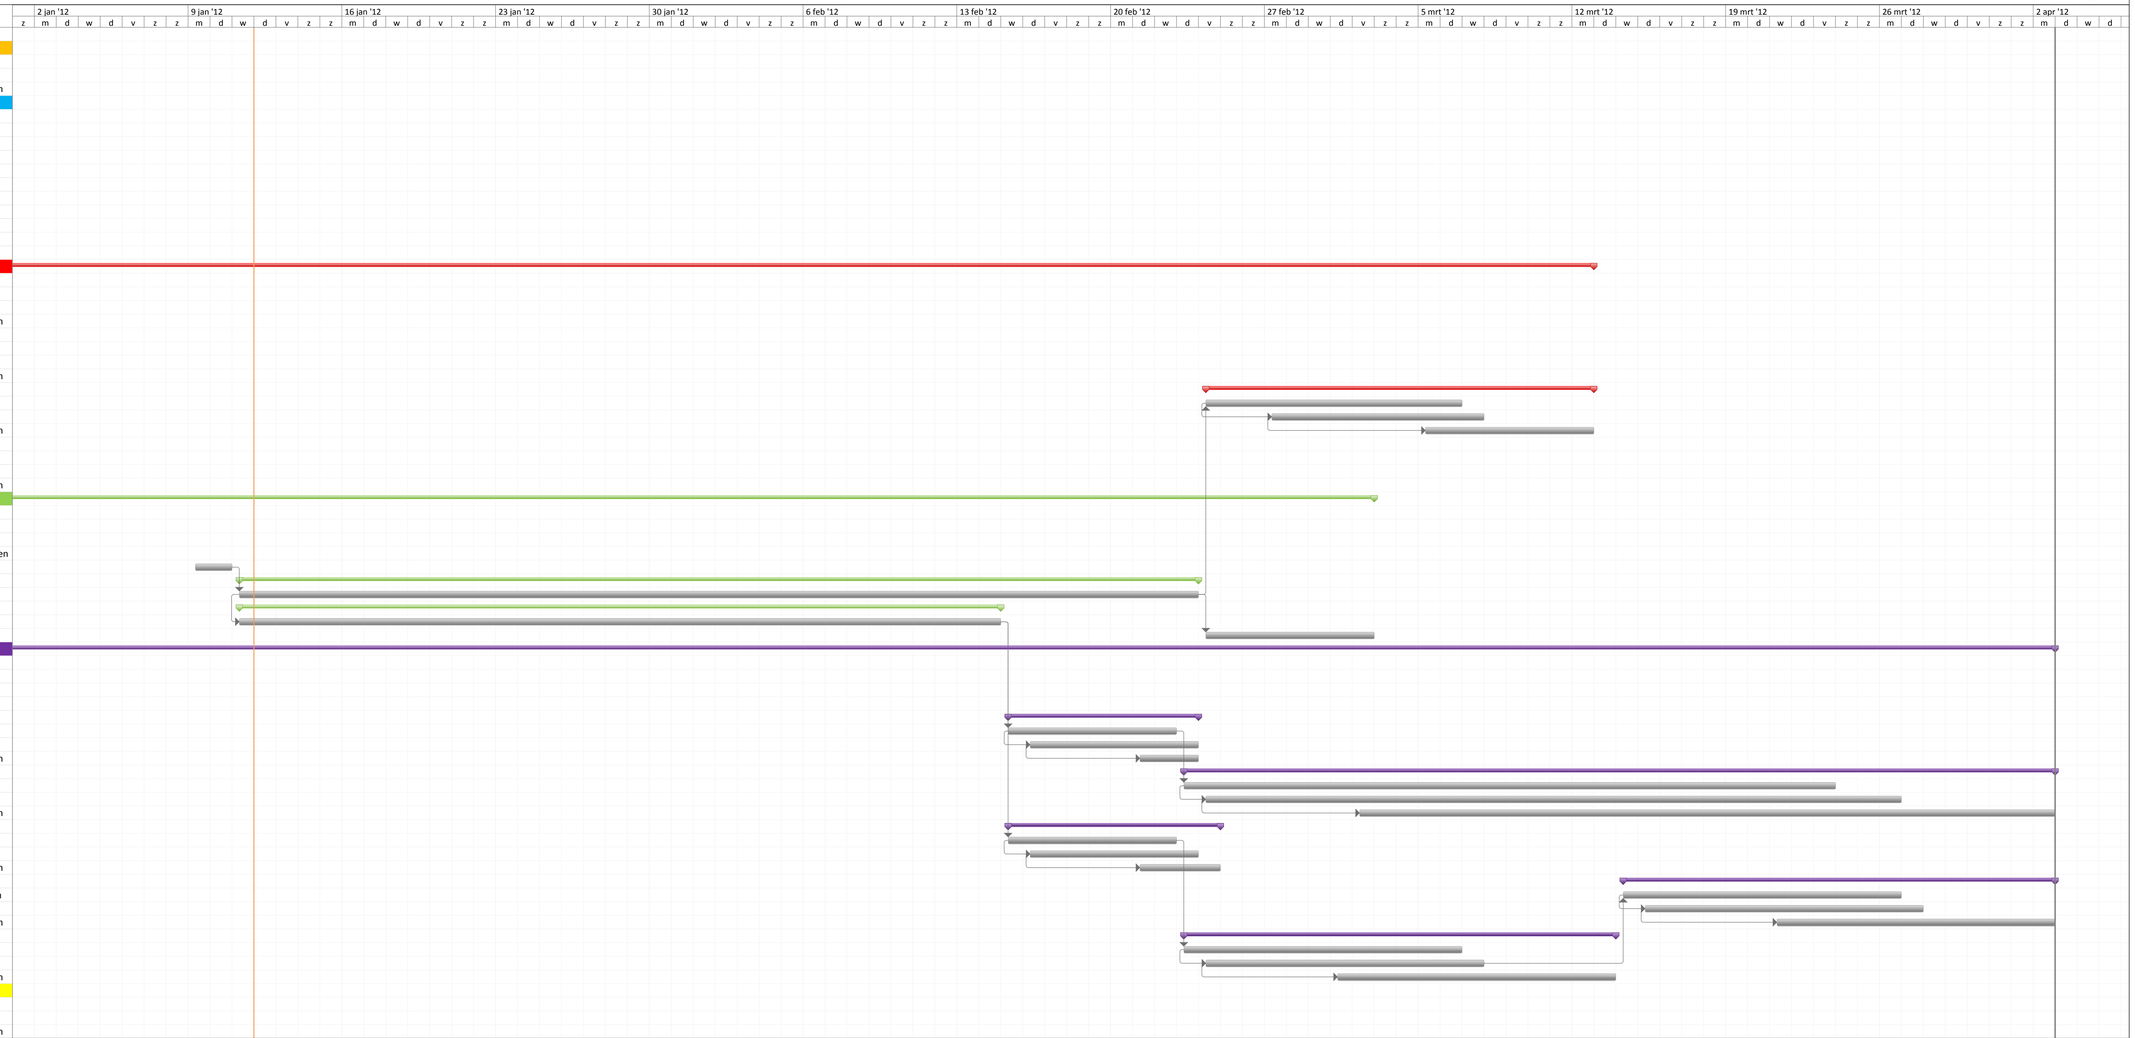

Project: Poelenburg Fase 1
Datum: don 12 jan '12
Versie: 2

Taak | Mijlpaal | Projectsamenvatting | Externe mijlpaal | Inactieve mijlpaal | Handmatig taak | Handmatige samenvatting | Alleen begindatum | Deadline
Splitsing | Samenvatting | Externe taken | Inactieve taken | Inactieve samenvatting | Alleen duur | Handmatige samenvatting | Alleen einddatum | Voortgang
